



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет об итогах реализации областной адресной инвестиционной программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Архангельск
11 июня 2014

Исполняющий обязанности
министра промышленности и
строительства Архангельской
области
В.Е. Прилепин



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение средств по главным распорядителям в 2013 году, млн. рублей


Всего инвестиций – 5 975,1 млн. рублей Общее количество объектов - 152



99,2%

ИНВЕСТИЦИЙ:

–минпромстрой АО
–мин ТЭК и ЖКХ АО
–агентство по транспорту АО

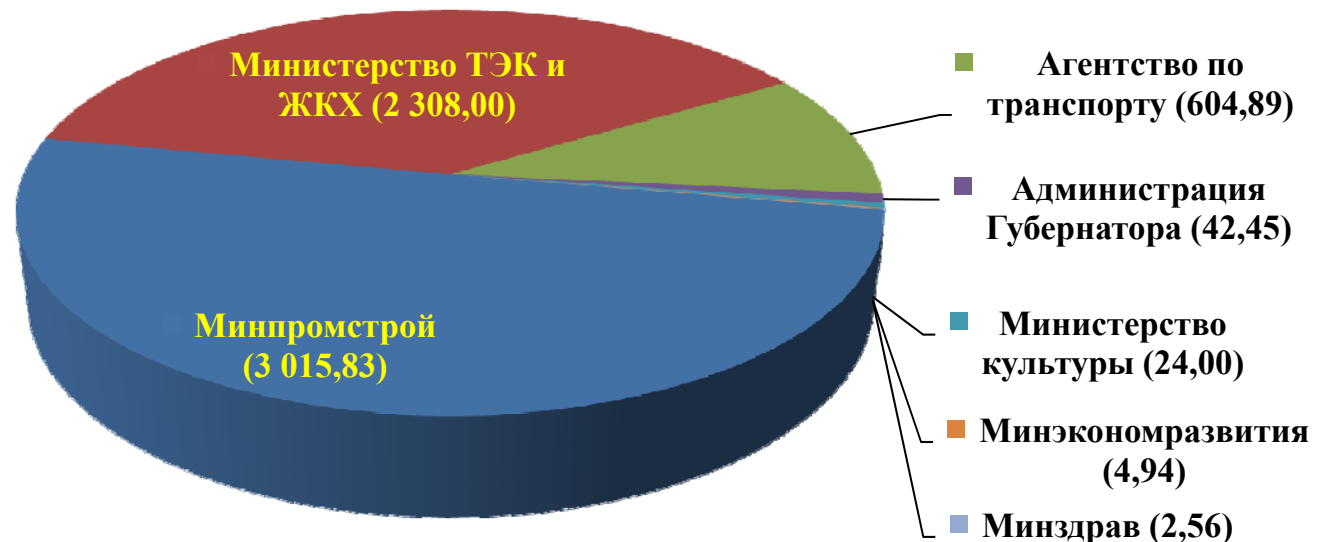



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Освоение средств министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области

Объем инвестиций – 2 308,00 млн. рублей



Основные направления:

1. Газификация Архангельской области*
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

В 2013 году реализованы мероприятия:

1. Выполнены работы по строительству газораспределительных сетей и газоснабжению квартир в 9 муниципальных образованиях Архангельской области
2. В г. Коряжма 150-ти земельным участкам для индивидуального жилищного строительства предоставлена возможность газификации
3. Газифицирована дер. Рикасиха Приморского муниципального района

* Распоряжение Правительства Архангельской области от 03 апреля 2014 г. № 69-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области “Газификация Архангельской области в 2012 – 2014 годах”».


** Распоряжение Правительства Архангельской области от 21 января 2014 г. № 5-рп «Об итогах реализации в 2013 году адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Архангельской области в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Освоение средств агентством по транспорту Архангельской области

Объем инвестиций – 604,89 млн. рублей

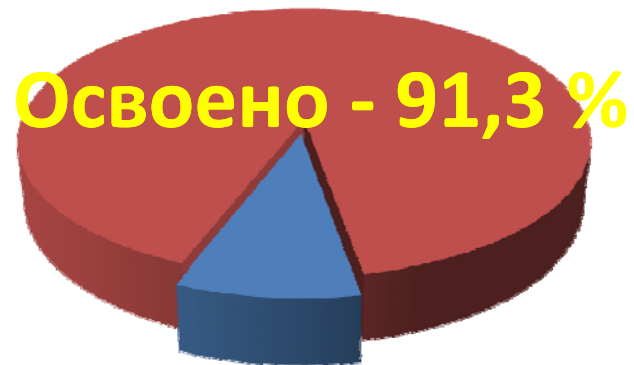

Основные направления:

1. Приобретение техники
2. Строительство и реконструкция дорог общего пользования

В 2013 году реализованы мероприятия:

1. Приобретены речные суда для грузопассажирских перевозок в МО «Онежский муниципальный район» и «Мезенский муниципальный район»
2. Построен мостовой переход через реку Тиньга на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень
3. Построена автомобильная дорога Архангельск (от пос. Брин-Наволоок) – Каргополь – Вытегра (до с. Прокшино) на участке Обход Плесеца


* Распоряжение Правительства Архангельской области от 18 марта 2014 г. № 57-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011 – 2015 годы)»




ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Освоение средств министерством промышленности и строительства Архангельской области

Объем инвестиций – 3 015,83 млн. рублей,
в том числе по отраслям:

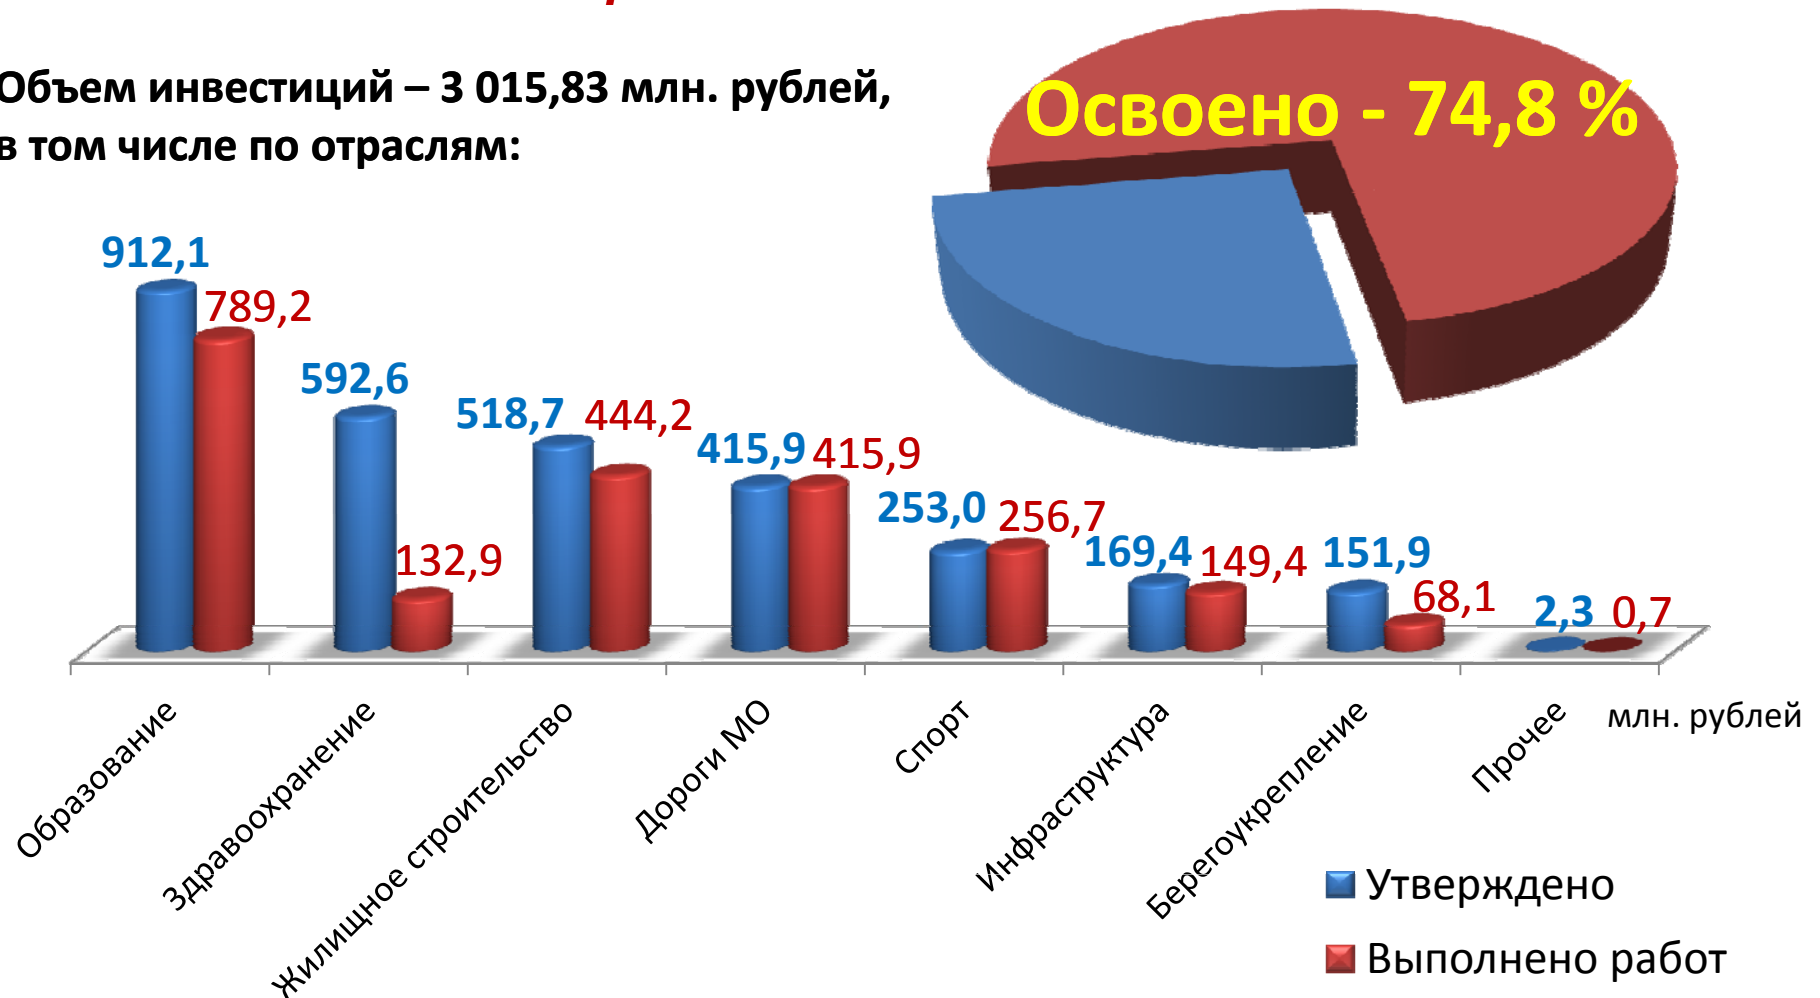



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Неиспользованные лимиты средств федерального и областного бюджетов

Объект	∑, млн. рублей	Причина
Федеральный бюджет, в том числе:		
Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы	779,4	Средства Фонда перечисляются по мере заключения МО муниципальных контрактов по строительству/приобретению жилых помещений. По требованиям Фонда окончательное расходование средств – до конца 2014 года
Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска	417,0	Средства поступили 31.12.2013
Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северной Двины в селе Холмогоры Архангельской области	69,4	Позднее заключение ГК (работы выполняются по ГПР)
Областной бюджет, в том числе:		
Строительство дошкольных образовательных учреждений	94,0	Средства бюджетного кредита поступили в конце декабря 2013 года, будут использованы в 2014 году
Улучшение жилищных условий работников гос. учреждений (строительство служебного жилья)	75,8	Переходящие сроки исполнения гос. контрактов по строительству служебного жилья
Реконструкция объекта «Областной онкологический диспансер, г. Архангельска» (в том числе приобретение оборудования)	35,1	Позднее заключение ГК (работы выполняются по ГПР), средства бюджетного кредита – и будут использованы в 2014 году



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты реализации ОАИП в 2013 году

Освоение – 83,8 %

Стоимость выполненных работ – 4 034,9 млн. рублей



Ввод 45 объектов, в том числе:

Жилищное строительство – 24

Инфраструктура – 8

Образование – 5

Дороги – 3

Спорт – 3

Здравоохранение – 2





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Областная больница в 62-А квартале г. Архангельска (1 этап)





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Детский сад на 60 мест в пос. Коноша Коношского района





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Школа на 240 мест в пос. Цигломень г. Архангельска





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г.Архангельске






ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Детский сад «Березка» в пос. Авнюгский Верхнетоемского района





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Предпринятые меры для повышения эффективности бюджетных инвестиций

1. Утверждены Правительством Архангельской области изменения в Порядок финансирования ОАИП в части установления объективных оснований для пересмотра параметров финансирования объектов
2. Формирование и контроль реализации графика проведения аукционных процедур
3. Заключение с заказчиками долгосрочных соглашений о реализации мероприятий по объектам
4. Утверждены Правительством Архангельской области изменения в Порядок формирования и реализации ОАИП в части вовлечения в ОАИП объектов незавершенного строительства



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**
